



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

CPV: 45232120-9

NUTS EL641

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32.1/2022 - (32/2018)

Έργο **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ**

Προυπ **2.012.900,12 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)**

Πηγή Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – **ΕΣΠΑ 2014-2020** & συγχρ/ση από το **Ε.Γ.Τ.Α.Α.** και το Ελληνικό Δημόσιο εγγεγραμμένο στο **ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1)** με Κωδικό **ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210014**
Κωδικός **Ο.Π.Σ.Α .Α .:** 0036167272

Χρήση **2022**

Μ Ε Λ Ε Τ Η

**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ»**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Gantt

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2022





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

CPV: 45232120-9

NUTS EL641

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 32.1/2022 - (32/2018)

Έργο **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ**

Προυπ **2.012.900,12 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)**

Πηγή Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – **ΕΣΠΑ 2014-2020** & συγχρ/ση από το **Ε.Γ.Τ.Α.Α.** και το Ελληνικό Δημόσιο εγγεγραμμένο στο **ΠΔΕ (Σ.Α.Ε.082/1)** με Κωδικό **ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210014**
Κωδικός **Ο.Π.Σ.Α .Α .:** 0036167272

Χρήση **2022**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Gantt

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2022




ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Duration	Start	Finish	Tr 2, 2022 May	Jun	Jul	Qtr 3, 2022 Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2023 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2023 Apr	May	Jun	Qtr 3, 2023 Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2024 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2024 Apr
0	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ	485 days	Thu 19/05/22	Wed 27/03/24																								
1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	120 days	Thu 19/05/22	Wed 02/11/22																								
2	Υπογραφή Σύμβασης	0 days	Wed 02/11/22	Wed 02/11/22																								
3	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής Έργου	15 days	Wed 02/11/22	Tue 22/11/22																								
4	Έλεγχος και Έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής Έργου	10 days	Wed 23/11/22	Tue 06/12/22																								
5	Εγκατάσταση του Εργοταξίου και Έναρξη εργασιών του Έργου	29 days	Wed 02/11/22	Mon 12/12/22																								
6	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Οργανογράμματος του Εργοταξίου.	30 days	Wed 02/11/22	Tue 13/12/22																								
7	Ανάληψη καθηκόντων του Προϊστάμενου του Εργοταξιακού Γραφείου (αποκλειστικής απασχόλησης) και του Αναπληρωτή του - Υποβολή των σχετικών Υπ. Δηλώσεων αποδοχής του διορισμού και των ευθυνών τους.	30 days	Wed 02/11/22	Tue 13/12/22																								
8	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΑΥ-ΦΑΥ).	6 days	Wed 02/11/22	Wed 09/11/22																								
9	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του ΠΠΕ	45 days	Wed 02/11/22	Tue 03/01/23																								
10	Έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ, ΠΠΕ από την Υπηρεσία	30 days	Wed 02/11/22	Tue 13/12/22																								
11	Επαλήθευση των στοιχείων από την Υπηρεσία, Γεωτεχνικές - Τοπογραφικές και λοιπές συμπληρωματικές Εργασίες, Μελέτες και Έρευνες και επιτόπου Μετρήσεις.	60 days	Wed 02/11/22	Tue 24/01/23																								
12	Διερεύνηση και επισήμανση δικτύων Ο.Κ.Ω. και λοιπών εμποδίων	60 days	Wed 02/11/22	Tue 24/01/23																								
13	Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία τυχών μελέτης Εφαρμογής για περιπτώσεις τυχών αλλαγών από δίκτυα και αρχαιολογία κοπήν τμήμα του Έργου.	13 days	Wed 02/11/22	Fri 15/11/22																								
14	Έλεγχος και Έγκριση τυχών Μελέτης Εφαρμογής για λόγους αρχαιολογίας και δικτύων	30 days	Mon 21/11/22	Fri 30/12/22																								
15	1. ΟΜΑΔΑ :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
16	Αρθρα Ομάδας :Χωματοργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία (Α/Α: 1.1 έως 1.12)	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
17	Εργασίες καθαρισμού εργοταξίου και αποκατάστασης τμημάτων έργου	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
18	2. ΟΜΑΔΑ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΣΤΕΓΑΝΣΕΙΣ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
19	Αρθρα Ομάδας : Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγανίσεις,οικοδομικά (Α/Α: 2.1 έως 2.14)	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
20	3. ΟΜΑΔΑ :ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
21	Αρθρα Ομάδας : Μεταλλικά στοιχεία & κατασκευές, Σωληνώσεις-Δίκτυα(Α/Α: 3.1 έως 3.20)	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
22	4. ΟΜΑΔΑ :ΗΜ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
23	Αρθρα Ομάδας :ΗΜ- Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Α/Α: 4.1 έως 4.33)	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
24	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
25	Παρακολούθηση εργασιών από Εφορία Αρχαιοτήτων	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
26	Συστητικές εργασίες από Αρχαιολογία (σε τυχών υπαρξη ευρημάτων)	264 days	Wed 02/11/22	Mon 06/11/23																								
27	Περάτωση Εργασιών	0 days	Thu 09/11/23	Thu 09/11/23																								
28	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	100 days	Thu 09/11/23	Wed 27/03/24																								

Project: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σελ. 1 / 1Έργα Π.Μ. Έργα ΗΜ Ορόσημο Ομάδα Έργων Αλιάρτος : 19-5-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

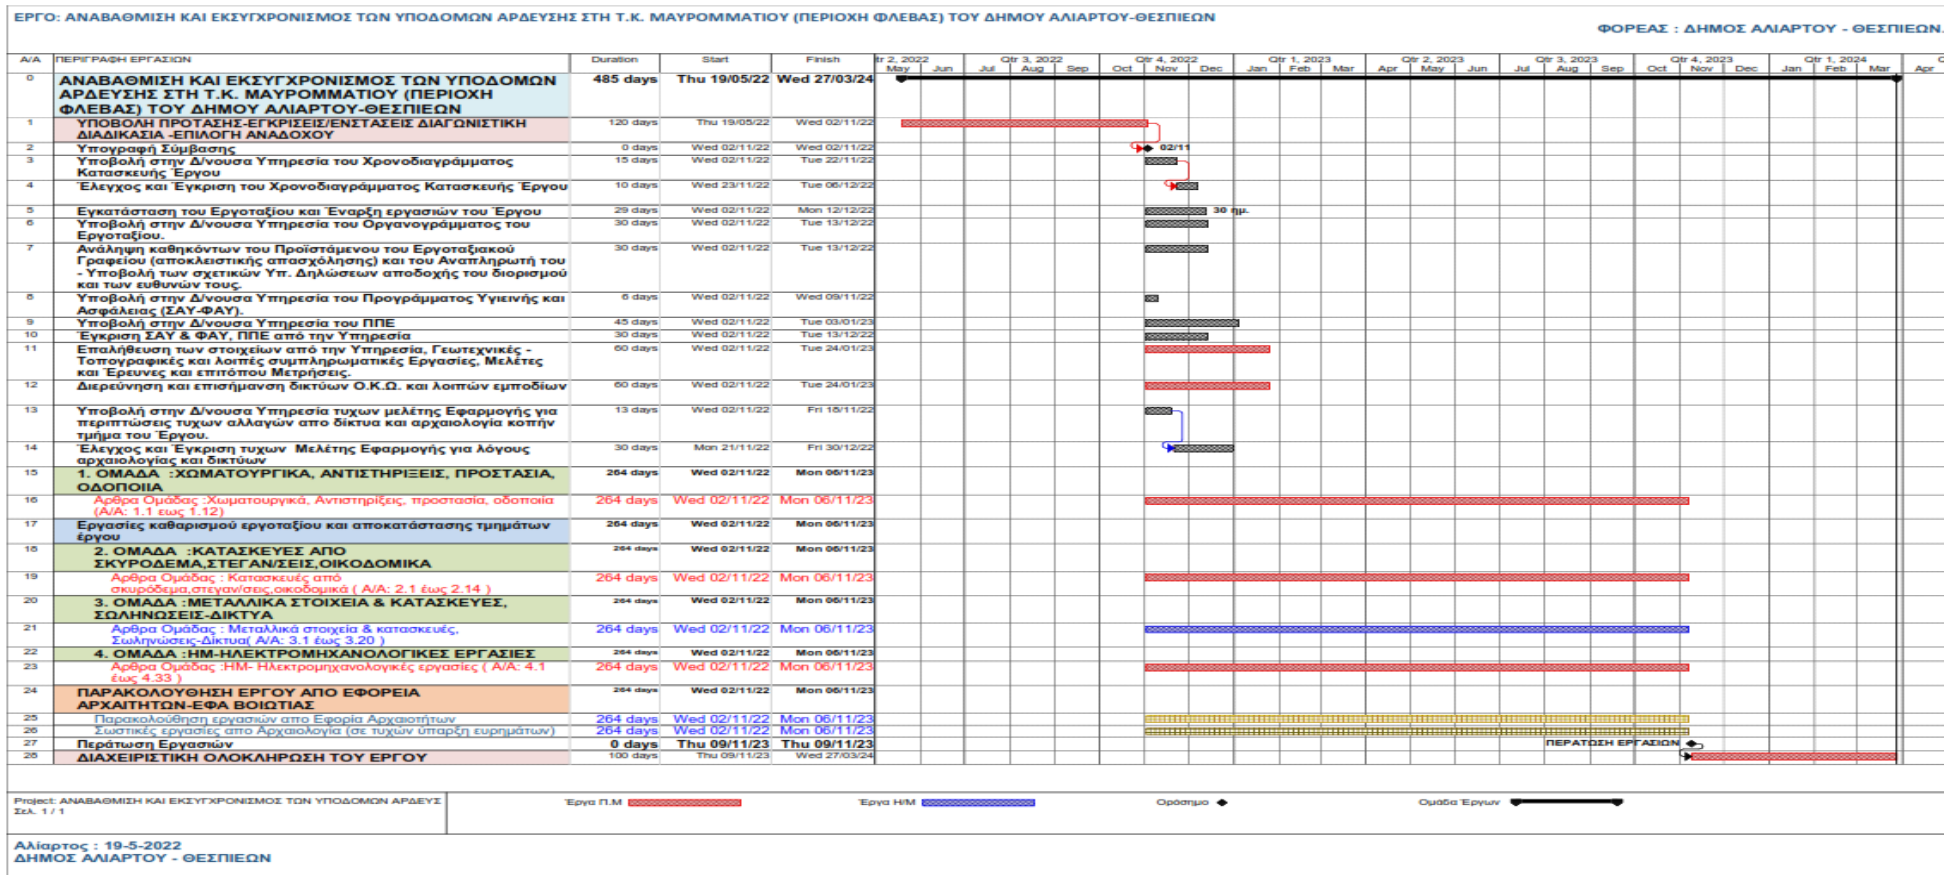

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022

ΒΑΡΟΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Δομικών Έργων
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-5-2022

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
